


# Fremtiden for MÅRUP KIRKE




Sommer 2008:

Kirken nedtages kontrolleret til ca. 2 meters højde. Alt inventar nedtages nænsomt og opbevares sikkert og kontrolleret for en evt. senere anvendelse. Blytaget pilles ned og opbevares autoriseret, eller sendes til genanvendelse. Alt træværk, spær mv., nedtages og opbevares.

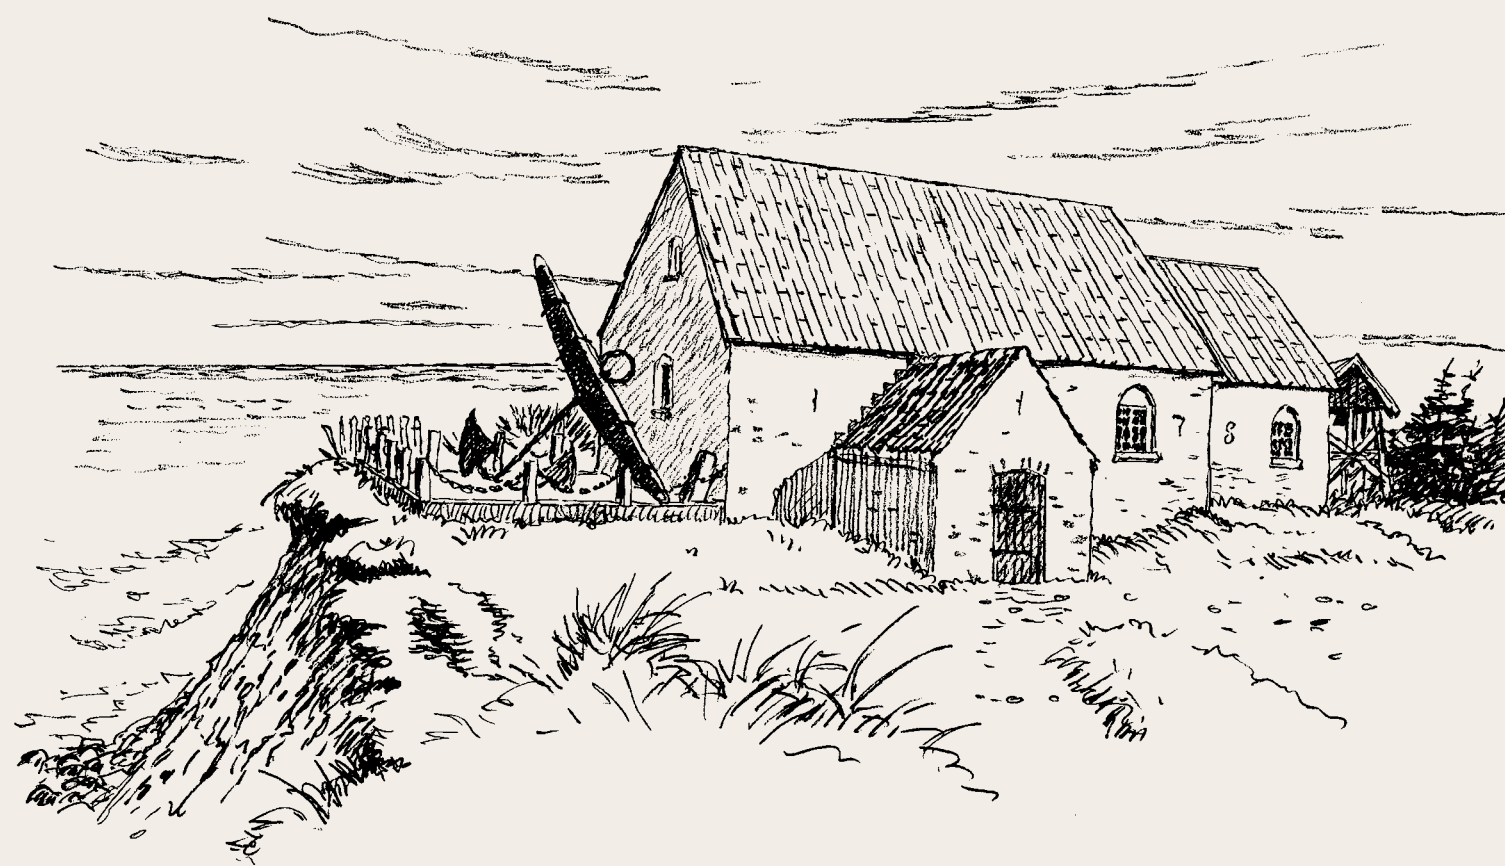

Efterår 2008:

Murene er nu taget ned til 2 meters højde. Alle sten nedtages og opbevares sikkert. Ankeret fra Crescent flyttes til en sikker placering omkring kirken (evt. uden for kirkegården) efter aftale med Fredningsmyndighederne.

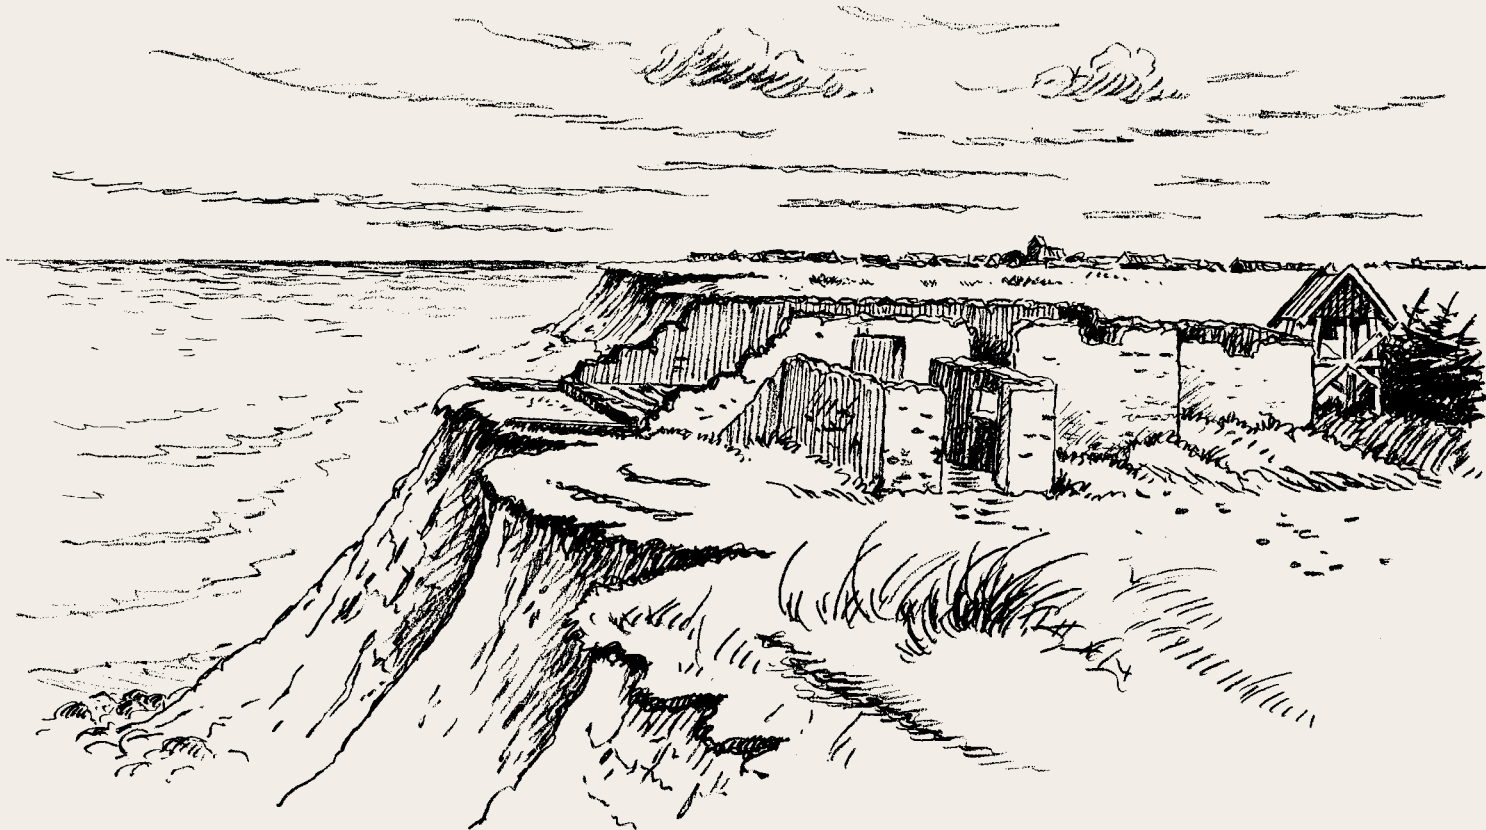

2008 og frem:

I takt med kystskræntens tilbagerykning nedtages de nu ca. 2 meter høje mure kontrolleret således, at der til enhver tid holdes en afstand til skrænten på ca. 6 meter.



Soklens lades tilbage så kirkens "omrids" er tydeligt. Forventet tid til nedtagning af østgavl: 6-9 år. Fremtid: En arbejdsgruppe i Lønstrup forsøger at skaffe midler til en genopførelse af Mårup Kirke. Hvis dette lykkedes, og en passende lokalitet kan findes, overdrager Skov- og Naturstyrelsen, når sidste sten er nedtaget, alle materialer til dette formål vederlagsfrit.



**Skov- og Naturstyrelsen**  
Vendsyssel Tlf. 98 44 19 11
